令和7年度 那覇港(新港ふ頭地区)岸壁(-10m)(耐震)地盤改良工事　概要書

（1）工事件名　令和７年度　那覇港(新港ふ頭地区)岸壁(-10m)(耐震)地盤改良工事

（2）工事場所　沖縄県那覇市港町地先

（3）工事期間　（自）　令和　７年　１１月　１２日
（至）　令和　８年　　５月　１５日（工期延伸協議中：9月下旬）

（4）工事内容　本工事は、那覇港(新港ふ頭地区)岸壁(-10m)(耐震)の共通工、海上地盤改良工事を行うものである。

（5）請負金額　￥１，８８８，０７３，０００－（内消費税　￥１７１，６４３，０００－）

（6）発 注 者　内閣府 沖縄総合事務局 開発建設部（TEL：098-876-7625）

（7）受 注 者　若築・みらい・大米 特定建設工事共同企業体（TEL：098-894-7251）

（8）担 当 者
現場代理人：（W）　井上　潔　　（TEL：090-2463-0058）
監理技術者：（W）　井上　潔
主任技術者：（M）　重村　祐也　　（TEL：080-2008-3540）
主任技術者：（D）　仲宗根　久　　（TEL：090-3793-7199）
担当技術者：（W）　中村　謙太　　（TEL：090-5601-5092）

（9）施工平面図

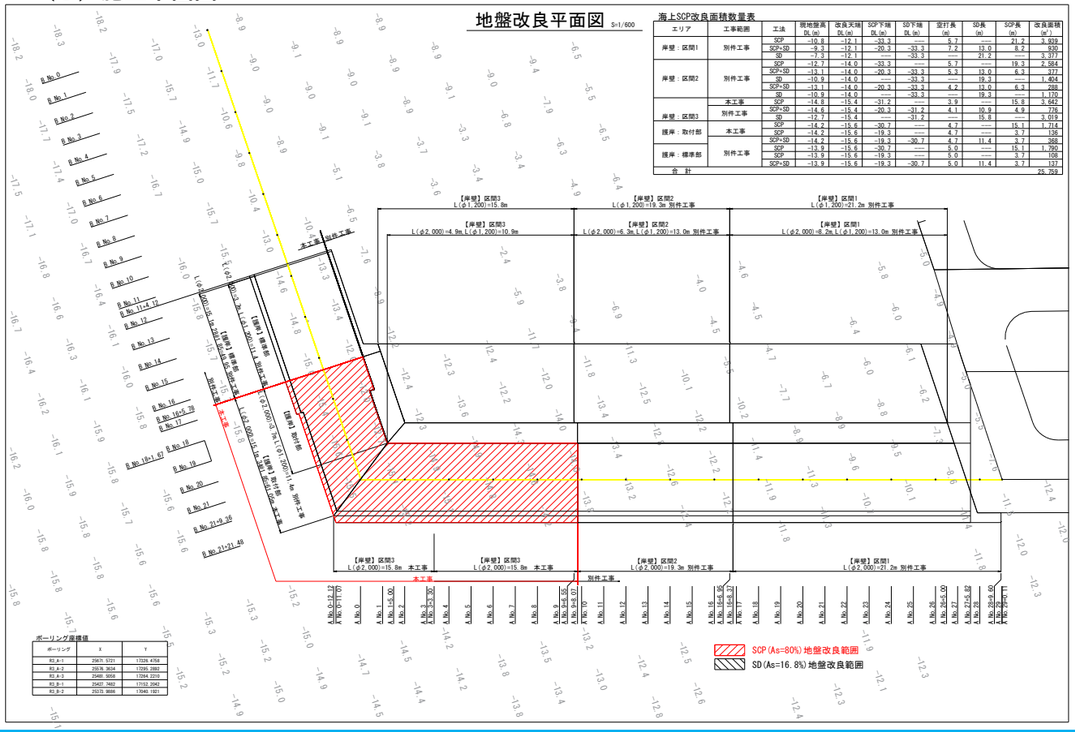

海上SCP改良面積数量表

エリア	工事範囲	工法	現地盤高 DL(m)	改良天端 DL(m)	SCP下端 DL(m)	SD下端 DL(m)	改打長 (m)	SD長 (m)	SCP長 (m)	改良面積 (㎡)
岸壁 区間1	別件工事	SCP	-10.8	-12.1	-33.3	----	5.7	----	21.2	3,939
		SCP+SD	-9.3	-12.1	-20.3	-33.3	7.2	13.0	8.2	930
		SD	-7.3	-12.1	----	-33.3	----	21.2	----	3,377
岸壁 区間2	別件工事	SCP	-12.7	-14.0	-33.3	----	5.7	----	19.3	2,984
		SCP+SD	-13.1	-14.0	-20.3	-33.3	5.3	13.0	6.3	377
		SD	-10.9	-14.0	----	-33.3	----	19.3	----	1,404
		SCP+SD	-13.1	-14.0	-20.3	-33.3	4.2	13.0	6.3	288
	本工事	SD	-10.9	-14.0	----	-33.3	----	19.3	----	1,170
岸壁 区間3	別件工事	SCP	-14.8	-15.4	-31.2	----	3.9	----	15.8	3,642
		SCP+SD	-14.6	-15.4	-20.3	-31.2	4.1	10.9	4.9	776
		SD	-12.7	-15.4	----	-31.2	----	15.8	----	3,019
護岸：取付部	本工事	SCP	-14.2	-15.6	-30.7	----	4.7	----	15.1	1,714
		SCP	-14.2	-15.6	-19.3	----	4.7	----	3.7	136
護岸：標準部	別件工事	SCP+SD	-14.2	-15.6	-19.3	-30.7	4.7	11.4	3.7	365
		SCP	-13.9	-15.6	-30.7	----	5.0	----	15.1	1,790
		SCP	-13.9	-15.6	-19.3	----	5.0	----	3.7	108
		SCP+SD	-13.9	-15.6	-19.3	-30.7	5.0	11.4	3.7	137
合 計										25,759

ボーリング座標値

ボーリング	X	Y
R1_A-1	25671.5721	17226.4764
R1_A-2	25576.3634	17295.3992
R3_A-3	25480.9858	17364.2210
R2_B-1	25457.7482	17152.2942
R3_B-2	25370.9886	17040.1921

（10）　施工位置図

（11）　計画工程表

工種	単位	数量	2025年 12月	2026年 1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月
準備工	式	1										
共通工	式	1										
海上地盤改良工	本	1,455										
チェックボーリング	本	3										
後片付け	式	1										

配員　現場代理人	若築	井上
監理技術者	若築	〃
主任技術者	みらい	重村
主任技術者	大米	仲宗根
担当技術者	若築	中村
